


# 新庁舎建設だより

平成29年5月

## ～ 現在、上部躯体工事が進行中です ～

5月25日から庁舎棟の地上骨組である鉄骨鉄筋コンクリート造の鉄骨部分の工事を進めております。  
今後、鉄骨組立→柱梁壁配筋→柱梁壁型枠→床型枠→床配筋→コンクリート打設というサイクルで進みます。

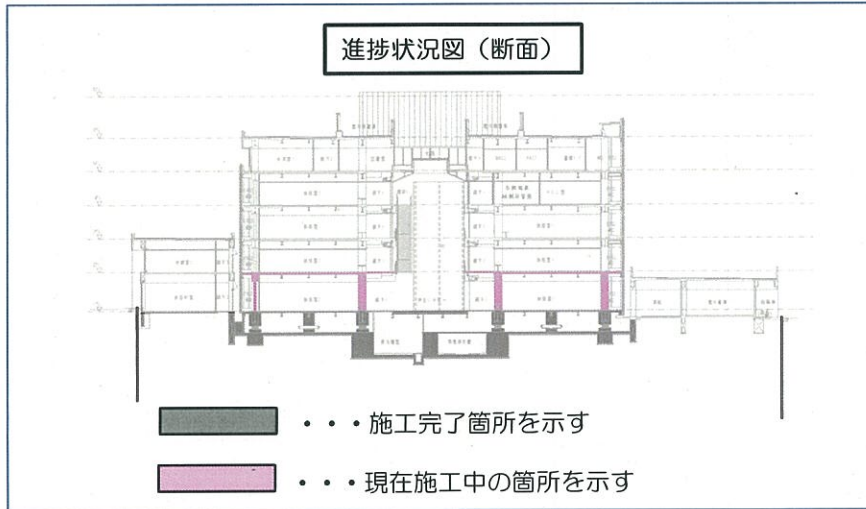

南側全景 既設庁舎から



建物の構造として、一般的に木造(W造)、鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)があります。

### ◇新庁舎の構造

庁舎棟：SRC造(一部RC造、S造)  
シビックプラットホーム棟：  
RC造(一部SRC造、S造)  
倉庫棟：RC造

北側 1階床面から



鉄骨は、運搬の関係から3節（3回に区切）施工します。

### ◇鉄骨の施工の区切

1節：1階柱～3階床  
2節：3階柱～6階床(屋上)  
3節：6階
