

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年4月17日

計画の名称	人と自然にやさしい都市公園の整備による安全安心な都市空間の形成		
計画の期間	平成23年度～平成27年度(5年間)	交付対象	周南市
計画の目標	周南市地域防災計画において、唯一広域避難地として位置づけられた徳山公園を市民の安全安心に資する防災公園として整備するとともに、本公園を核とした観光交流及び環境都市を目指し、徳山駅から本公園までを都心軸として、既存ストックを活用したまちづくりを推進する。		

計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害時に必要な避難地となるオープンスペースを4,200㎡(H22)から5,200㎡(H27)に増加させる。</li> <li>徳山動物園の利用者数を30万人/年(H22)から40万人/年(27年)に増加させる。</li> </ul>
----------------	---

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考	
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)		
① 徳山公園北工区の避難地となるオープンスペースを計測する。	4,200㎡	4,200㎡	5,200㎡		
② 徳山動物園、文化会館の利用者数を計測する。	30万人/年	35万人/年	40万人/年		
全体事業費	合計(A+B+C) 2,050 百万円	A 1,655 百万円	B 0 百万円	C 395 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C) 19.3 %

事後評価

○事後評価(中間評価)の実施体制、実施時期	
事後評価(中間評価)の実施体制	事後評価(中間評価)の実施時期
周南市において事後評価を実施	計画終了後 公表の方法 周南市ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
A-4	公園	一般	周南市	直接	周南市	都市公園事業(徳山公園)	公園面積 A=8.2ha	周南市						1,655	※3
合計													1,655		

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
合計															

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
C-4	施設整備	一般	周南市	直接	周南市	徳山動物園動物舎等整備事業	公園施設(動物舎等)の再整備	周南市						395	※4
C-5	活動支援	一般	周南市	直接	周南市	徳山動物園駐車場整備事業	駐車場整備面積 0.4ha	周南市							※5
合計													395		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
C-4	施設整備(A-4)と合わせ、広域避難地としての利活用を目的とした動物舎や広場、駐車場等の再整備を図ることで、避難地や拠点として利用しやすいオープンスペースを創出する。	
C-5	徳山公園整備事業(動物園リニューアル)(A-4)と一体に徳山公園隣接の駐車場を整備することにより、徳山公園の利用者の利便性が増進され、利用者増が促進される。	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況


I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>徳山公園北工区の避難地となるオープンスペースが増加し、防災機能が向上した。</li> <li>徳山動物園の利用者が徐々に増加傾向にある。</li> </ul>			
	指標	最終目標値	最終実績値	目標値と実績値に差が出た要因
II 定量的指標の達成状況	指標① (徳山公園北工区の避難地となるオープンスペース面積)	5,200 ㎡	4,640 ㎡	当初の想定通り事業が進捗しなかったため、目標に達しなかった。
	指標② (徳山動物園の利用者数)	40.0 万人	30.8 万人	当初の想定通り事業が進捗しなかったため、目標に達しなかった。
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現 (必要に応じて記述)				

3. 特記事項(今後の方針等)

<ul style="list-style-type: none"> <li>次期整備計画の中で整備を進め、平成30年度にオープンスペースの目標値に到達する見込みである。</li> <li>今後も引き続き徳山公園の施設整備を推進し、公園利用における快適性や利便性及び美観の向上に努め、更なる利用者の増加を図る。</li> </ul>
--



計画の名称	人と自然にやさしい都市公園の整備による安全安心な都市空間の形成		
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度	交付対象	山口県周南市

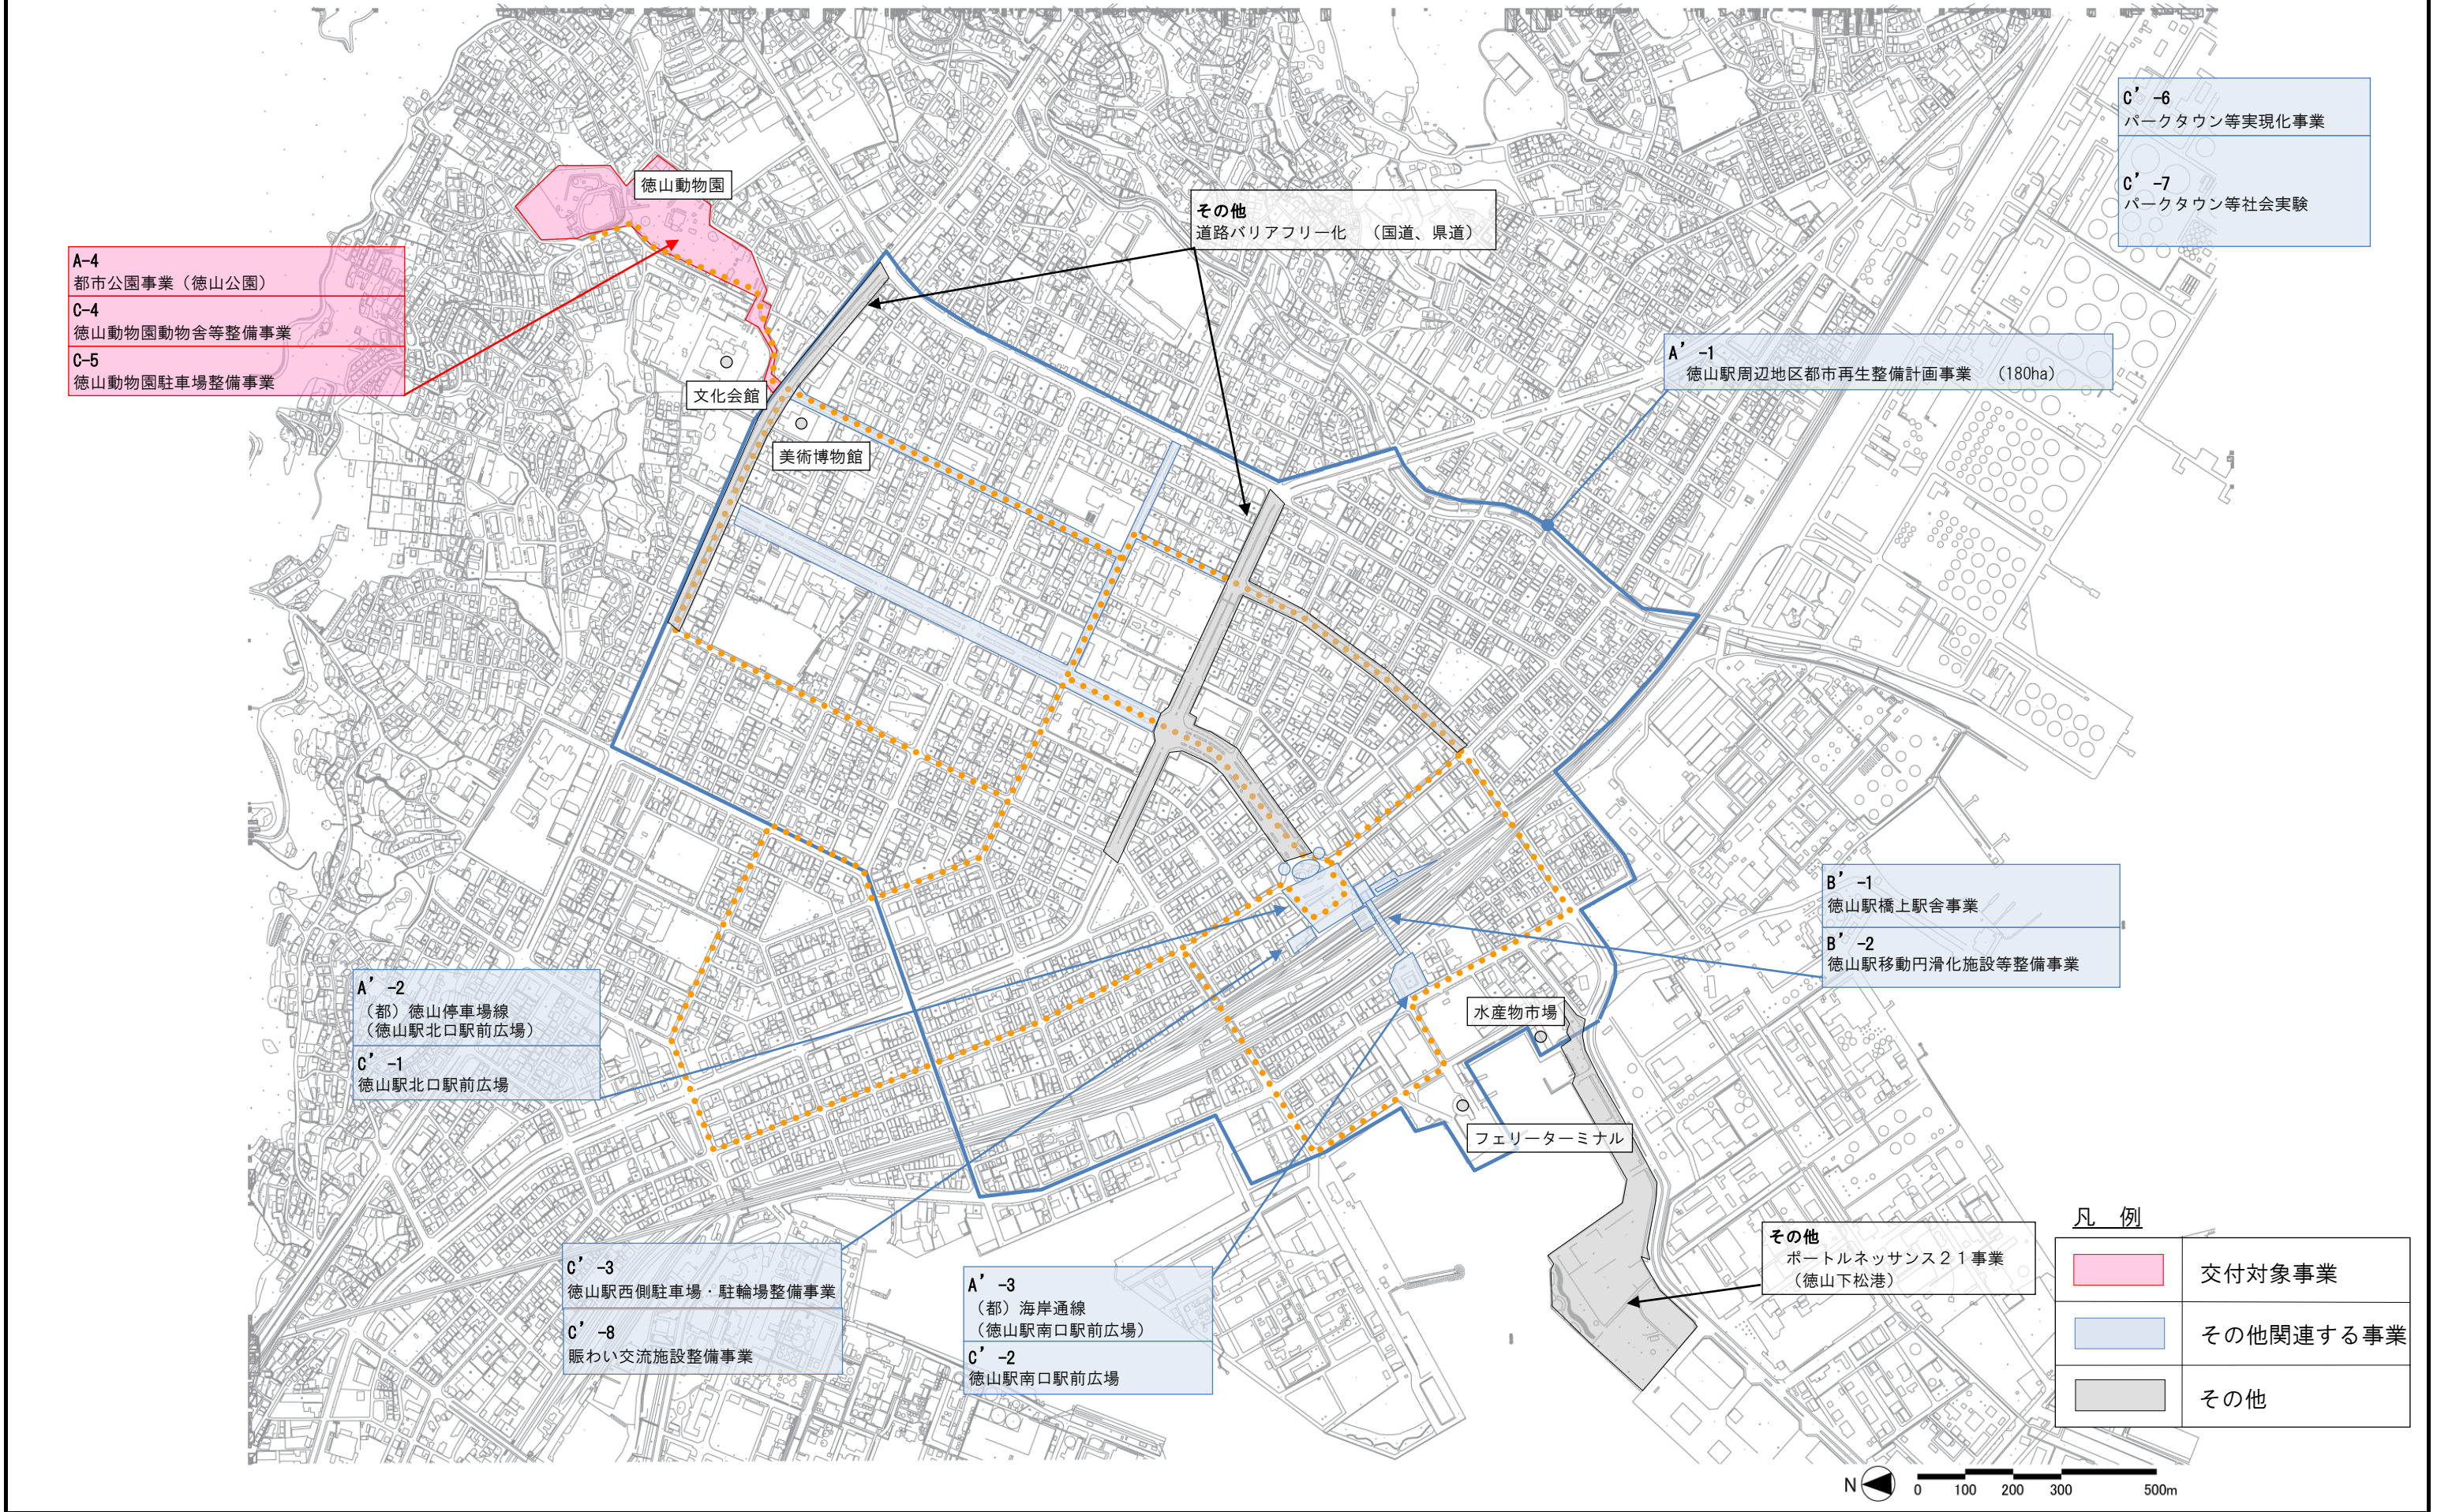

A-4  
都市公園事業（徳山公園）  
C-4  
徳山動物園動物舎等整備事業  
C-5  
徳山動物園駐車場整備事業

A'-2  
（都）徳山停車場線  
（徳山駅北口駅前広場）  
C'-1  
徳山駅北口駅前広場

C'-3  
徳山駅西側駐車場・駐輪場整備事業  
C'-8  
賑わい交流施設整備事業

A'-3  
（都）海岸通線  
（徳山駅南口駅前広場）  
C'-2  
徳山駅南口駅前広場

その他  
道路バリアフリー化（国道、県道）

A'-1  
徳山駅周辺地区都市再生整備計画事業（180ha）

B'-1  
徳山駅橋上駅舎事業  
B'-2  
徳山駅移動円滑化施設等整備事業

その他  
ポータルネッサンス21事業  
（徳山下松港）

C'-6  
パークタウン等実現化事業  
C'-7  
パークタウン等社会実験

凡例

<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color: #FFB6C1; border: 1px solid black;"></span>	交付対象事業
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black;"></span>	その他関連する事業
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black;"></span>	その他

