

古川跨線橋架け替え工事について

令和2年6月末から通行止めを開始した古川跨線橋の架け替え工事は、ご近隣の皆様、ご通行者様のご協力により、順調に作業が進んでいます。ついては、今後の工事の予定についてお知らせいたします。

なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から、皆様にお集まりいただいていた説明会開催に至らず、書面にてご連絡となることをご容赦願います。

■令和3～4年度の工事内容

これまで、回覧文書や説明会等でご説明したとおり、引き続き、令和10年頃まで古川跨線橋の架け替え工事を進めていきます。橋梁撤去工事も2年目に差し掛かり、今年度からは、更に2年近くかけて鉄道内北側半分を占める延長約42mの鋼橋の撤去を開始します。



① 鉄道に近接するコンクリート橋撤去工事


予定工期：令和3年4月～令和3年7月

工事内容：【鉄道近接作業】橋梁1径間の撤去

施工者：広成建設株式会社 担当：角南・大原 tel:083-600-2204

② 鉄道内の鋼橋撤去工事

鉄道内の鋼橋撤去工事は下記のイメージで実施されます。

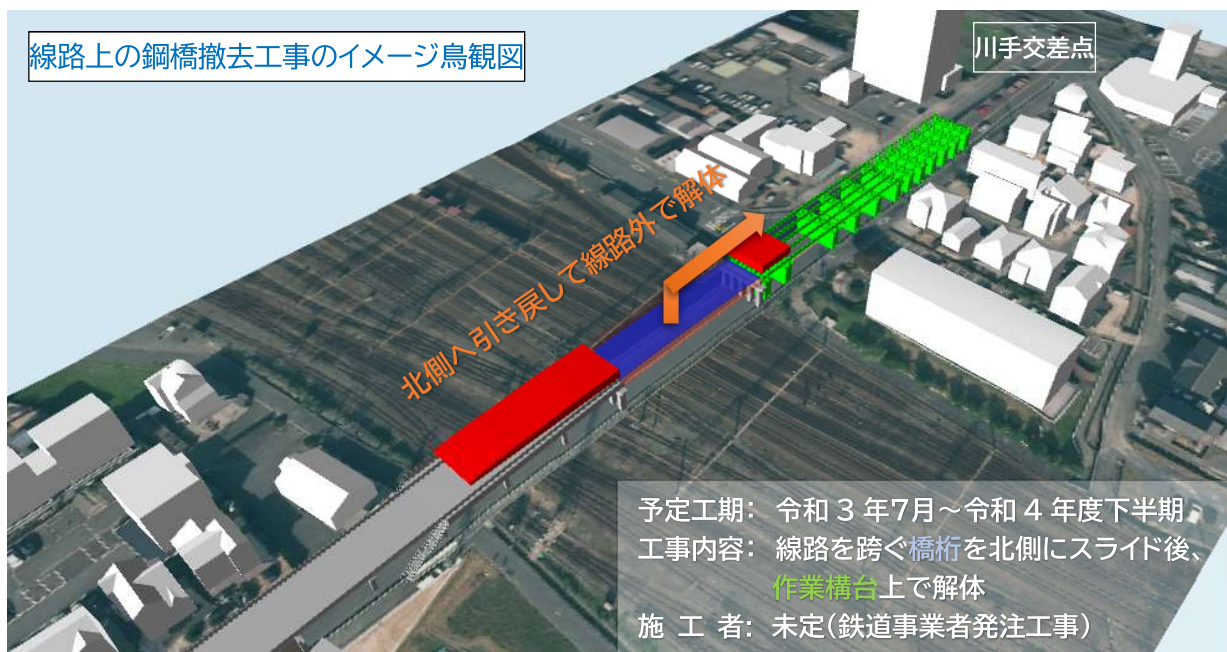

③ 側道幅員の減少に伴う歩行者対策工事(線路北側の川手二丁目エリア)

今後の工事では、これまで同様、側道の幅員が狭くなります。引き続き、案内看板等による通行車両の速度抑制を行います。特に現在歩道の無い側道部では、側溝蓋を埋設することで、舗装幅を広くし、更に、カラー区画線で歩行部分を明確化することで、歩行者の安全を確保します。



<工事概要>

予定工期:令和3年5月~令和3年7月末
 施工者:(有)大島土木 担当:田中
 tel:0834-25-5712

④ 道路内インフラ施設の移転工事について

道路には、皆様の生活を支える電気・通信・ガス・水道・下水道等多くのインフラ施設が配置されています。架け替え工事に支障する施設の移転工事も随時行われるため、ご理解ご協力をお願いします。詳細は各施設管理者よりご案内します。

令和3~4年度 古川跨線橋撤去工事 工程表

箇所	内容	令和3年度												令和4年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	I	II	III	IV	
北側道内	道路占用户移設工事			水道移設工事													ガス・NTT移設工事	
	市発注工事		準備工	路側カラー化による歩行空間整備													雨水排水路移設工事	
近接橋	準備工			鉄道に近接したコンクリート橋と階段部の撤去工事														
鉄道内	鉄道管理者発注工事			準備工					鋼橋撤去工事								→【完了後】南側コンクリート橋撤去工事	
				電気通信施設・その他鉄道内施設の移設工事														

■工事についての連絡事項

- 大きな騒音・振動を伴う取り壊し作業は、引き続き郊外のヤードで実施します。
- 道路上での作業時間帯は 8:00 ~ 17:00の昼間作業を予定していますが、万一、夜間に道路工事を行う場合には、別途ご案内します。
- 鉄道上空の作業は、主に運行時間外の夜間に実施されます。
- 工事に伴う交通規制については、改めて回覧文書や工事看板にてご案内します。
- 工事に関する各種ご相談は、下記問い合わせ先をお願いいたします。
- 工事の進捗状況等について定期的にホームページに掲載していますので、ご覧下さい。

■問い合わせ先■

周南市建設部道路課 橋りょう長寿命化推進室
 TEL:0834-22-8279 FAX:0834-22-8252
 E-Mail:douro@city.shunan.lg.jp
 ホームページ <http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/37/>
 右のQRコードからホームページにアクセスできます。



周南市 古川跨線橋 検索

(令和3年4月)
