
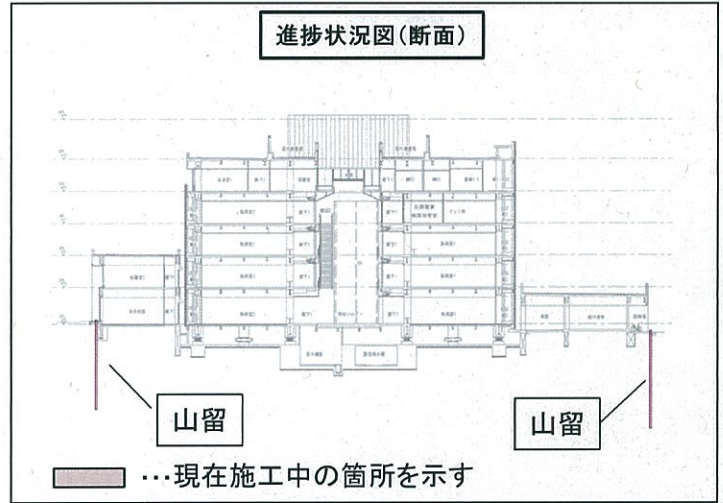


## ～ 山留工事が進行中です ～

現在、基礎工事に向けて、山留工事を行っています。

山留とは、土を掘削したことにより、周囲の土が崩れることを防ぐため、鋼材や土留板で壁を作ることです。

山留工事の完了後は、建物の基礎工事の作業を進めていきます。

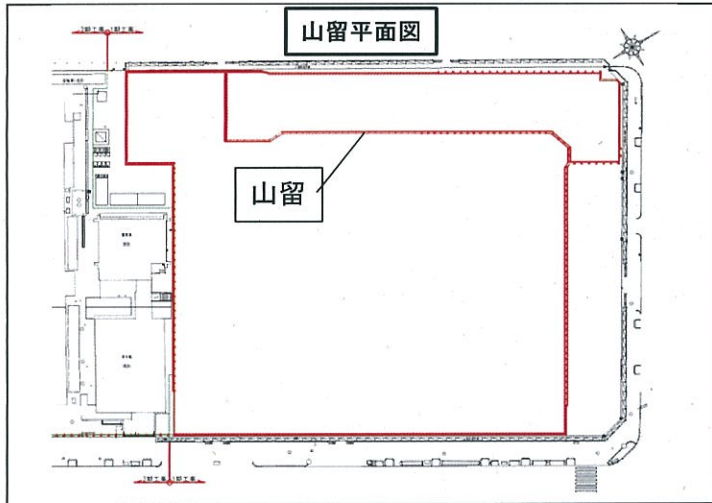

【親杭削孔状況】



クレーンで所定の深さまで掘削し、H鋼を建込みます。これを部位ごとに決められたサイズ、長さのものを順番に打設していきます。

【横矢板設置完了(一部)】



親杭を打設完了後、横矢板を設置します。土を深さ約1.5mごとに掘削し、厚さ3cmから5.5cmの板をH鋼とH鋼の間に挟む手順で構築していきます。
