

■ 事業概要

① 施設整備概要

令和7年度～令和8年度

- ⑫ 新水泳場（25m屋内水泳場（健康ルーム含む）建設他）
【工期】2025年11月～2027年3月末（令和9年4月オープン）

新水泳場整備イメージ図



令和6年度～令和8年度

- ④ 陸上競技場（公認第3種：管理棟建替、全天候舗装他）
⑤ ランニングコース（野球場・陸上競技場周辺：カラー舗装他）
【工期】陸上競技場：2024年10月～2026年3月末
ランニングコース：2026年2月～7月下旬

陸上競技場管理棟整備イメージ図



陸上競技場内及びランニングコース整備イメージ図



令和6年度

- ① 陸上競技場西駐車場整備
【工期】2024年4月～8月下旬

凡 例

- 施設リニューアル箇所
- 既存施設改修・補修箇所
- 駐車場の新規整備箇所

令和6年度

- ② 野球場東駐車場
【工期】2024年5月～2025年3月末

令和6年度

- ③ 屋外トイレ建替
【工期】2024年12月中旬～2025年3月末

令和6年度

- ⑦ サッカー場（人工芝・観覧席設置他）
【工期】2024年7月上旬～2025年3月末

令和6年度

- ⑨ 屋外トイレ改修
【工期】2025年1月～3月末

令和6年度

- ⑥ 総合スポーツセンター北西駐車場
【工期】2024年4月～7月中旬

令和7年度

- ⑩・⑪ 総合スポーツセンター改修
（屋根・外壁補修、LED化他）
【工期】2025年4月～2026年3月末

令和6年度

- ⑧ 庭球場（人工芝の張替補修）
【工期】2024年9月上旬～2025年3月末

サッカー場整備イメージ図



令和6年度

- ⑦ 屋外トイレ改修
【工期】2025年1月～3月末

【主な施設整備の概要】

・ 陸上競技場のリニューアル

・ 屋内水泳場の新設

・ サッカー場のリニューアル

・ 駐車場の増設

・ トイレの改修

・ 劣化した施設の補修改修

- ▶ 設置後約50年経過した陸上競技場の改修
- ▶ 令和6年度から着工、令和8年4月リニューアルオープン予定



- ▶ 設置後約50年経過した中央緑地の屋外水泳場については解体後、駐車場に
- ▶ 自動車学校跡地に25m屋内水泳場を建設（令和7年度着工、令和9年4月オープン予定）



サッカー場のリニューアル

5

- ▶ クレイコートであったサッカー場に人工芝を敷設、スタンドも新設
- ▶ 令和6年度着工、令和7年4月リニューアルオープン予定





- ▶ 不足する駐車場について新規に整備
- ▶ 現状の約600台のスペースから
約1200台へ
- ▶ 主な駐車場は令和6年度中に整備後
順次、使用開始
(新水泳場の駐車場は令和9年4月から)

■全体計画

②工事概要

③工事スケジュール

建設工事は

- ▶ 大林組
- ▶ 洋林建設
- ▶ 大林道路

の3社で役割分担して行います。

□中央緑地

施設名	主な項目	主な項目	工事期間	2024年度 (令和6年度)												2025年度 (令和7年度)												2026年度 (令和8年度)											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
① 陸上競技場西駐車場 (周陽公園向かい)	既存建屋解体/整備	2024年(令和6年) 4月～8月下旬	約4.5ヶ月																																				
② 野球場東駐車場 (既存屋外水泳場)	既存建屋解体/整備	2024年(令和6年)5月 ～2025年(令和7年)3月下旬	約10.5ヶ月																																				
③ 陸上競技場南側屋外トイレ	既存建屋解体/更新	2024年(令和6年)12月中旬 ～2025年3月末	約3.5ヶ月																																				
④ 陸上競技場改修 (公認3種)	既存建屋解体/新管理棟新 設/インフィールド他	2024年(令和6年)10月 ～2026年(令和8年)3月末	約1年6ヶ月																																				
⑤ ランニングコース (陸上競技場・野球場外周)	カラー舗装 /フットライト他	2026年(令和8年) 2月～7月下旬	約5.5ヶ月																																				

□東緑地

施設名	主な項目	工事実施時期	工事期間	2024年度 (令和6年度)												2025年度 (令和7年度)												2026年度 (令和8年度)														
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
⑥ 総合スポーツセンター北西駐車場	駐車場整備	2024年（令和6年） 4月～7月中旬	約3.5ヶ月																																							
⑦ サッカー場	人工芝敷設/観覧席整備	2024年（令和6年）7月上旬 ～2025年（令和7年）3月末	約8.5ヶ月																																							
⑧ 庭球場	人工芝敷設替	2024年（令和6年）9月上旬 ～2025年（令和7年）3月末	約6.5ヶ月																																							
⑨ 屋外トイレ （桜の森・梅の園）	ブース等改修	2025年（令和7年） 1月～3月末	約3.0ヶ月																																							
⑩ 総合スポーツセンター （屋外）	屋根改修/屋上防水	2025年（令和7年） 4月～3月下旬	約11.5ヶ月																																							
	外壁補修	2025年（令和7年）8月 ～2026年（令和8年）1月下旬	約5.5ヶ月																																							
⑪ 総合スポーツセンター （屋内照明LED化）	多目的ホールLED	2025年（令和7年） 7月～9月中旬	約2.5ヶ月																																							
	メインアリーナLED	2025年（令和7年） 8月中旬～11月下旬	約3.0ヶ月																																							
	その他共用部LED	2025年（令和7年） 7月～11月下旬	約4.5ヶ月																																							

□東緑地メインエントランス(旧自動車学校跡地)

施設名	主な項目	工事実施時期	工事期間	2024年度 (令和6年度)												2025年度 (令和7年度)												2026年度 (令和8年度)											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
⑫ 新水泳場 (屋内25m公認/健康ルーム) ※令和9年4月～供用開始予定	建設/駐車場整備他	2025年(令和7年)11月 ～2026年(令和8年)12月末	約1年1ヶ月																																				
	開業準備	2027年(令和9年) 1月～3月末	約3.0ヶ月																																				

■安全対策

④基本的な考え方

⑤安全対策の具体例

⑥周辺交通対策

④工事期間中の安全対策等の基本的な考え方

【工事時間帯】

- ・ 作業時間 原則平日の８時００分～１８時００分とします。
- ・ やむを得ない場合を除き、土曜・日曜・祝日は、作業をいたしません。

【安全環境対策】


- ・ 歩行者優先、安全第一を徹底いたします。
- ・ 工事区域と一般エリア（公園利用者）は仮囲い・立入禁止看板等で明確に分離します。
- ・ 工事車両出入口、交差点には、必要に応じ誘導員を配置し、付近の道路は最徐行で通行いたします。
- ・ 騒音・振動作業は低騒音型の機械を選定し、発生音の少ない施工に努めます。
- ・ 粉塵に配慮し散水・清掃に努めます。また、不要な排ガスを抑制し環境美化に努めます。

【周知方法】

- ・ 工事箇所、通行止め等を示した看板を設置します。
- ・ 各施設窓口、総合スポーツセンター内LEDビジョン等で詳細を公開します。
- ・ 周南市、周南緑地スポレパークのホームページに最新情報を公開します。


⑤工事計画-1（直近R6年度の具体例）

①陸上競技場西駐車場整備（工事期間：2024年4月～8月）

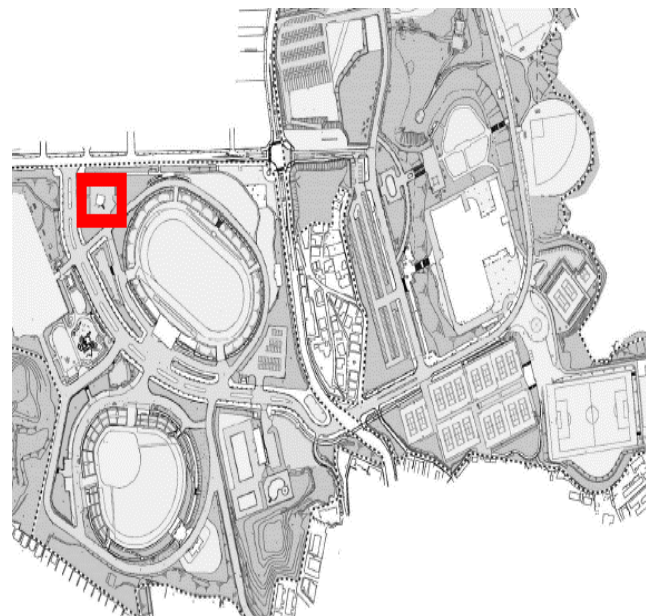

□：施工箇所

公園利用者との
交錯部には
交通誘導員を配置

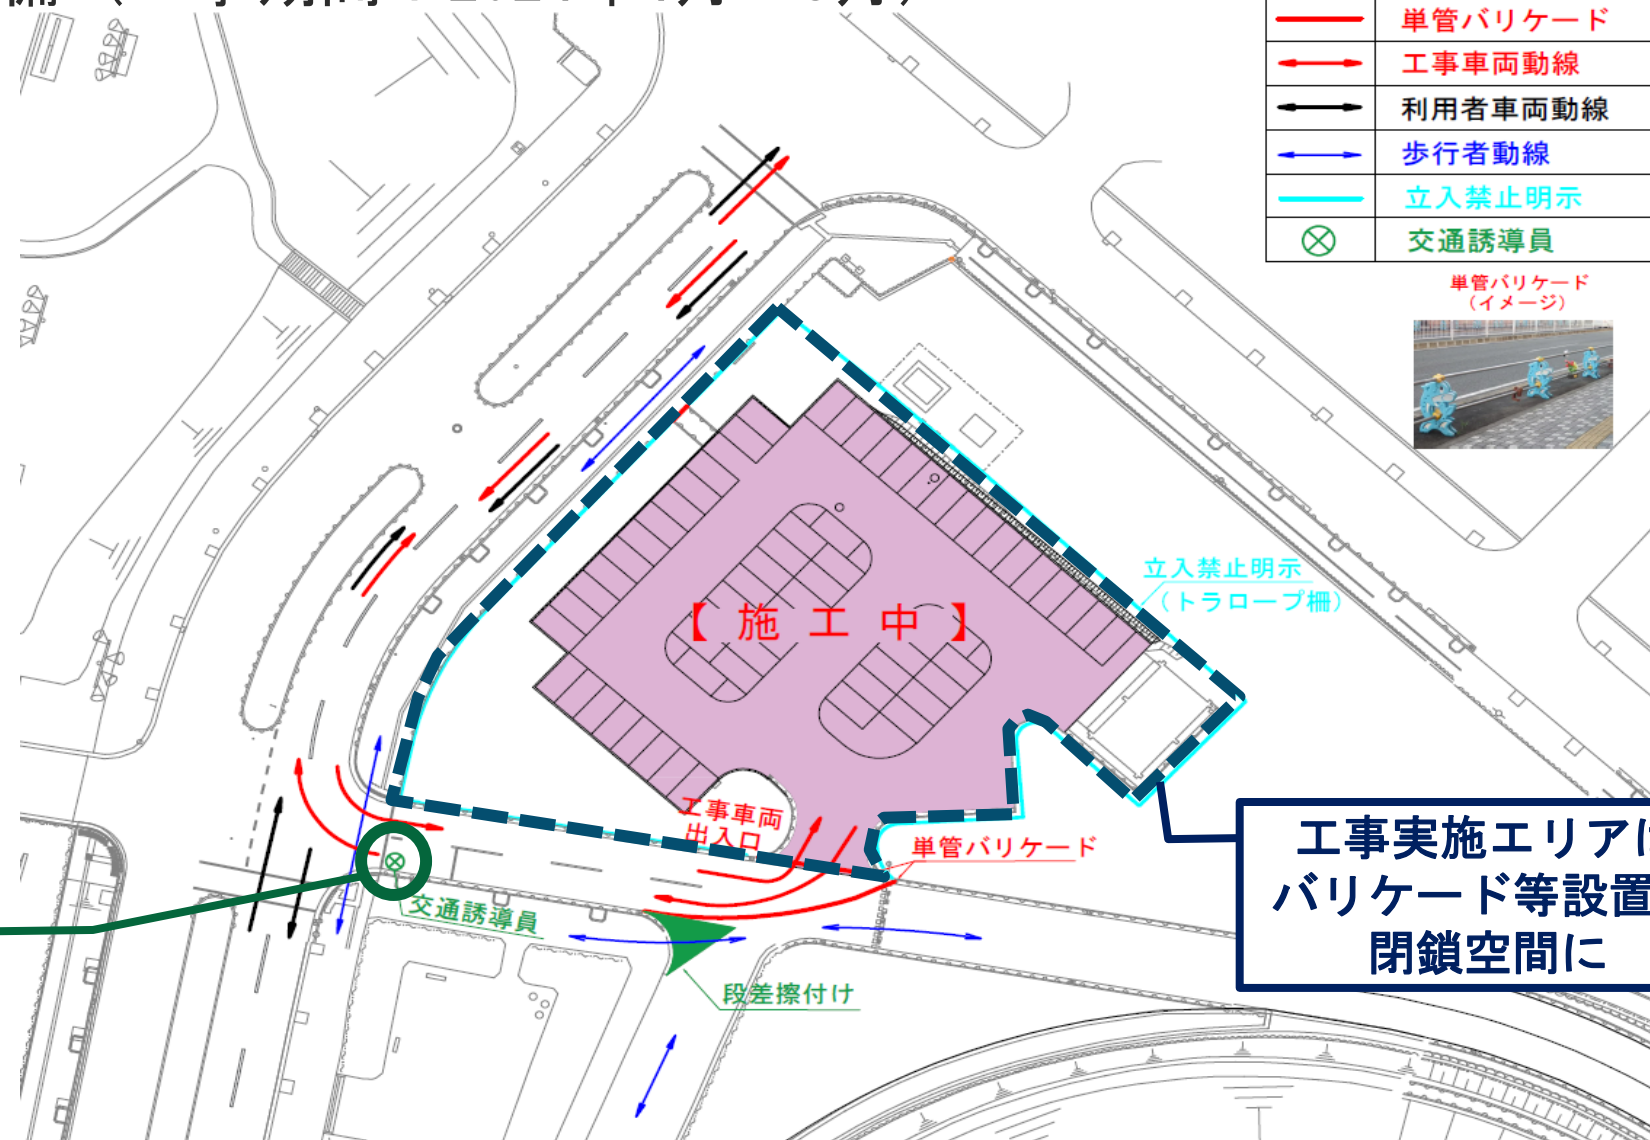

【凡例】

	単管バリケード
	工事車両動線
	利用者車両動線
	歩行者動線
	立入禁止明示
	交通誘導員

単管バリケード
(イメージ)




立入禁止明示
(トラロープ柵)

工事実施エリアは
バリケード等設置で
閉鎖空間に

⑤工事計画-2 (直近R6年度の具体例)


13

④陸上競技場改修・新管理棟建設 (工事期間：2024年10月～2026年3月)

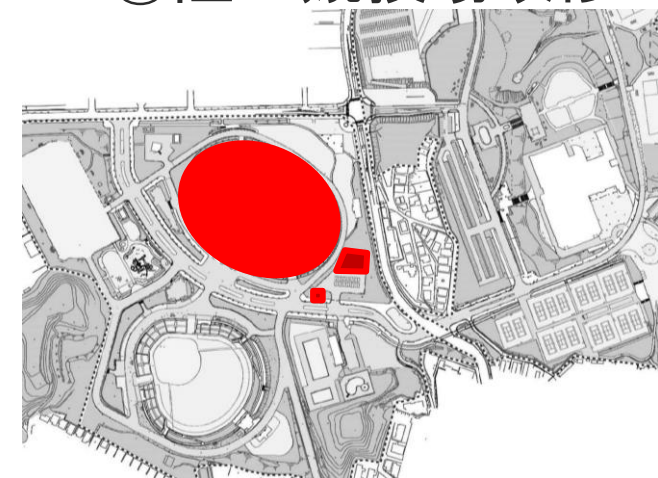

【凡例】

	仮囲い
	工事車両 主動線
	利用者車両 主動線
	歩行者
	工事エリア
	車道
	歩道
	交通誘導員(随時)

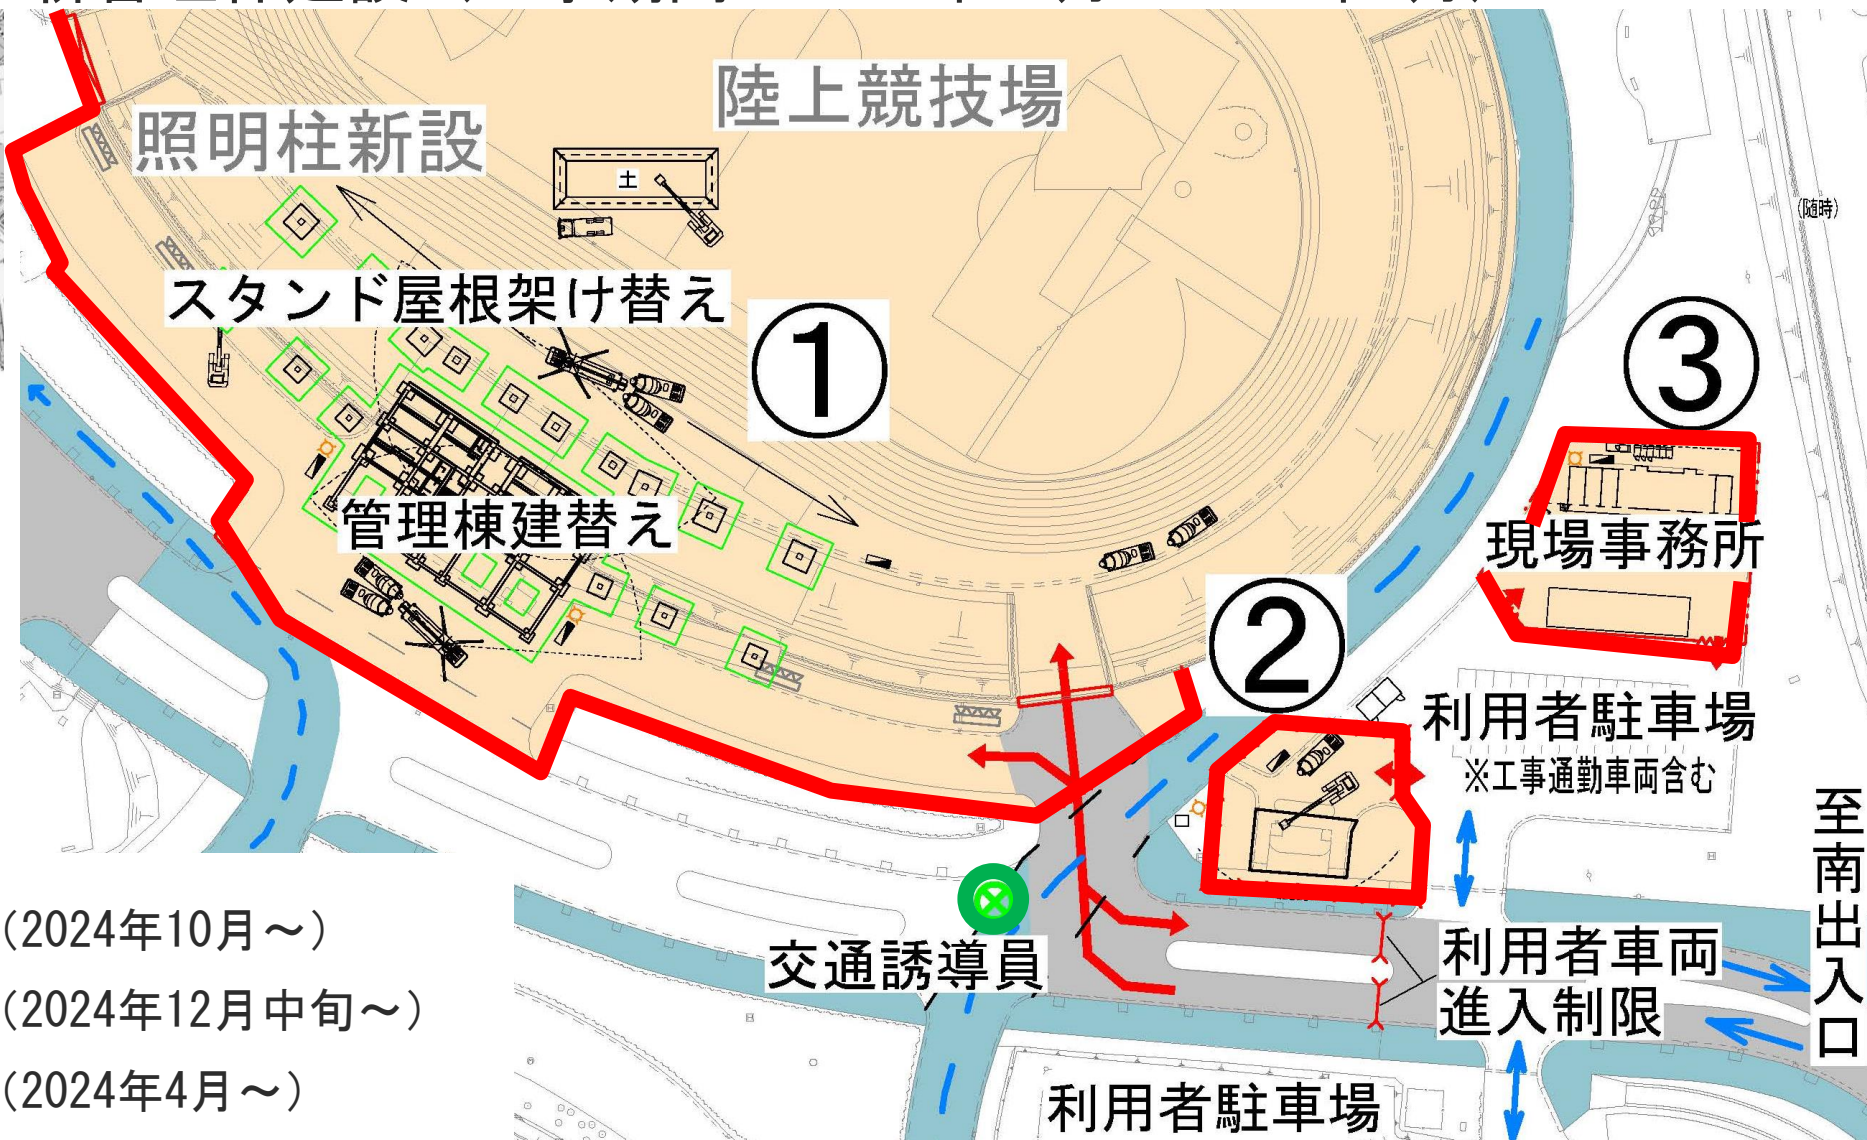

【工事期間】

- ①陸上競技場改修 18ヶ月 (2024年10月～)
- ②屋外トイレ改修 3.5ヶ月 (2024年12月中旬～)
- ③現場事務所設置 27ヶ月 (2024年4月～)

⑤工事計画-3（直近R6年度の具体例）

トイレ改修時の代替トイレ設置について

代替トイレイメージ



【工事期間】


①桜の森・梅の里

②陸上競技場南側

屋外トイレ 3.5ヶ月

（工事期間：2024年12月中旬～2025年3月）

（※サッカー場のトイレ改修時には
庭球場のトイレをご利用ください）

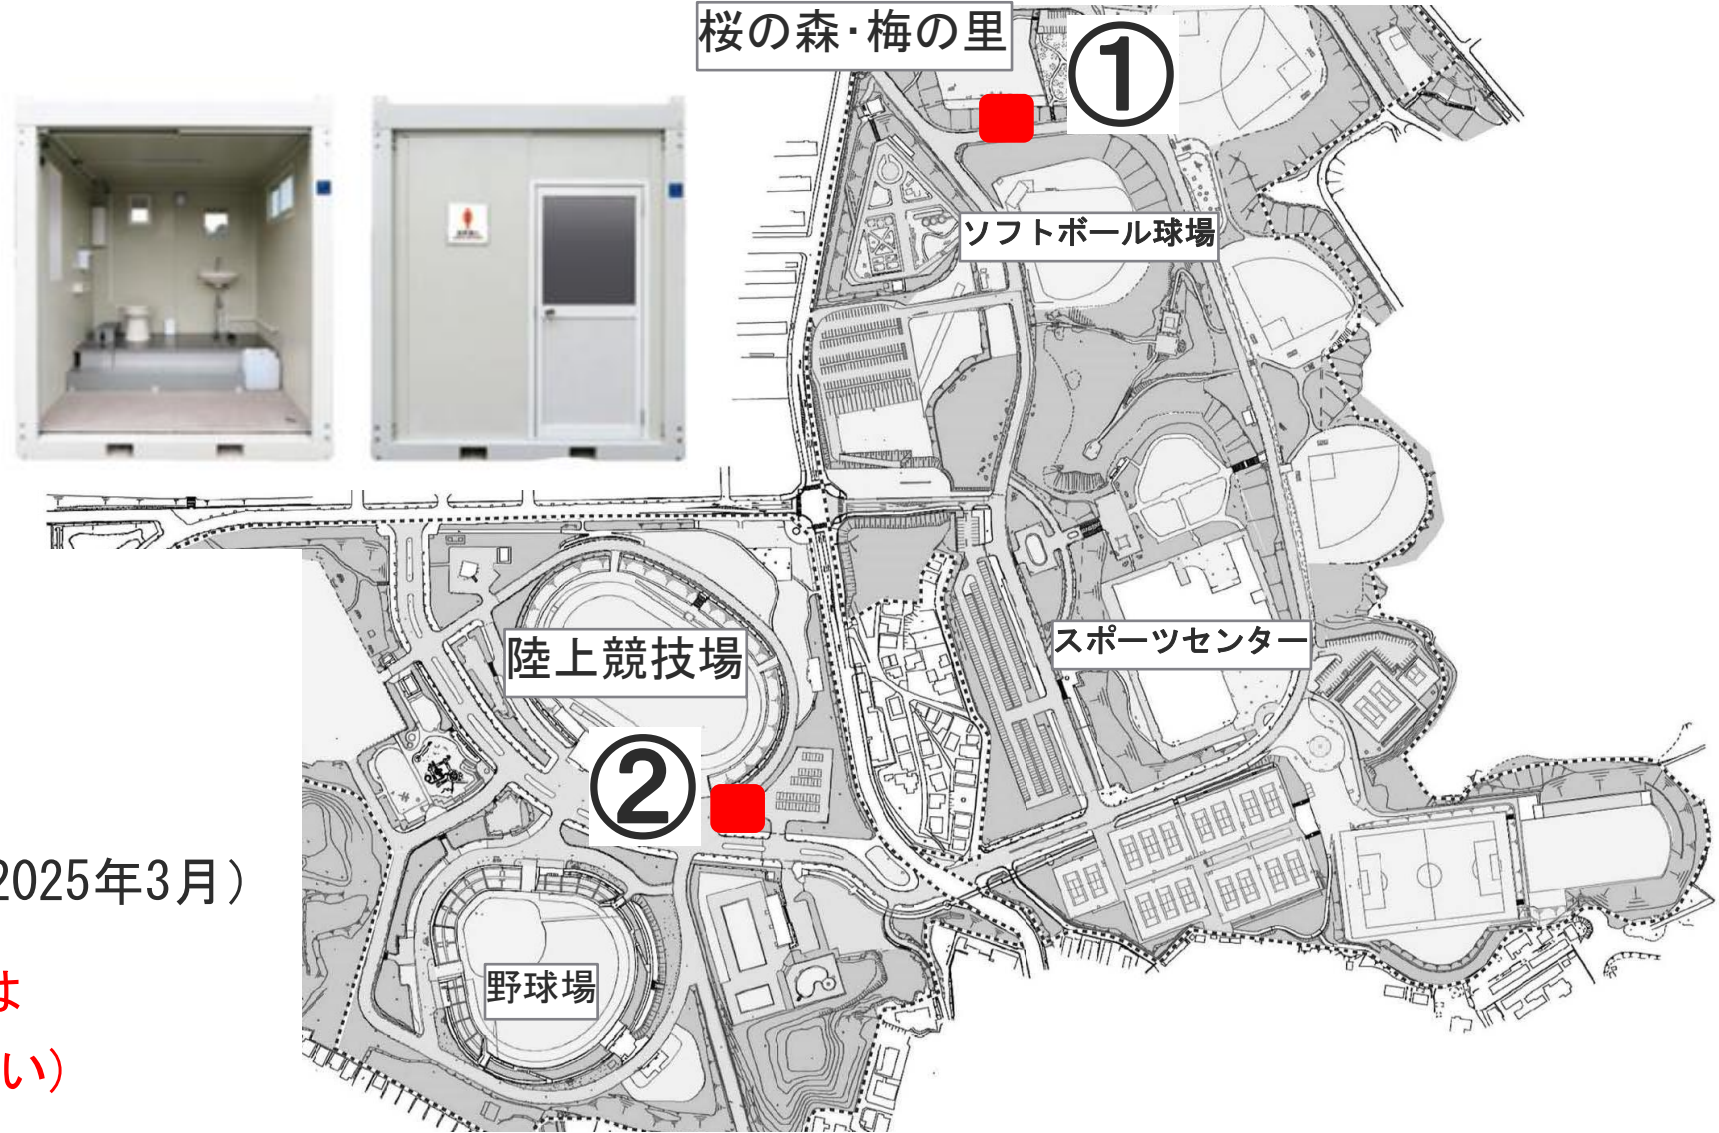

■大規模大会開催時の対応について

- ・ 平日も含め大規模大会等がある際には、工事工程を調整するなど
周南緑地の指定管理者（運営：アックススポーツファシリティーズ）と連携しながら工事を進めます。

■工事期間中の駐車可能台数について

- ・ 陸上競技場西駐車場、総合スポーツセンター北西駐車場を先行して整備し、
駐車台数は現状の約600台以上を確保しながら、段階的に駐車台数を増設します。

＜駐車台数推移＞

2024年4月～7月：600台（既存駐車場利用可）

2024年8月：+80台（総合SC北西駐車場整備完了）

2024年9月～12月：+60台（陸上競技場西駐車場整備完了）

2025年4月～：+411台（野球場東駐車場整備完了）

2027年4月～：+69台（新水泳場整備完了）

■周知・連絡体制

⑦工事に関する情報

⑧その他窓口等

⑦施設利用や工事に関する規制情報

17

施設利用や工事に関する規制情報は下記によりお知らせします。


1. 周南緑地の主要な入口・動線に看板を設置し、工事を実施している箇所や通行止めの箇所などを示した看板を設置します。
2. 総合スポーツセンター内LEDビジョンで随時最新情報をお知らせします。
3. 周南市、周南緑地スポレパークのホームページに随時最新情報を掲載します。

周南市HP



周南緑地スポレパークHP



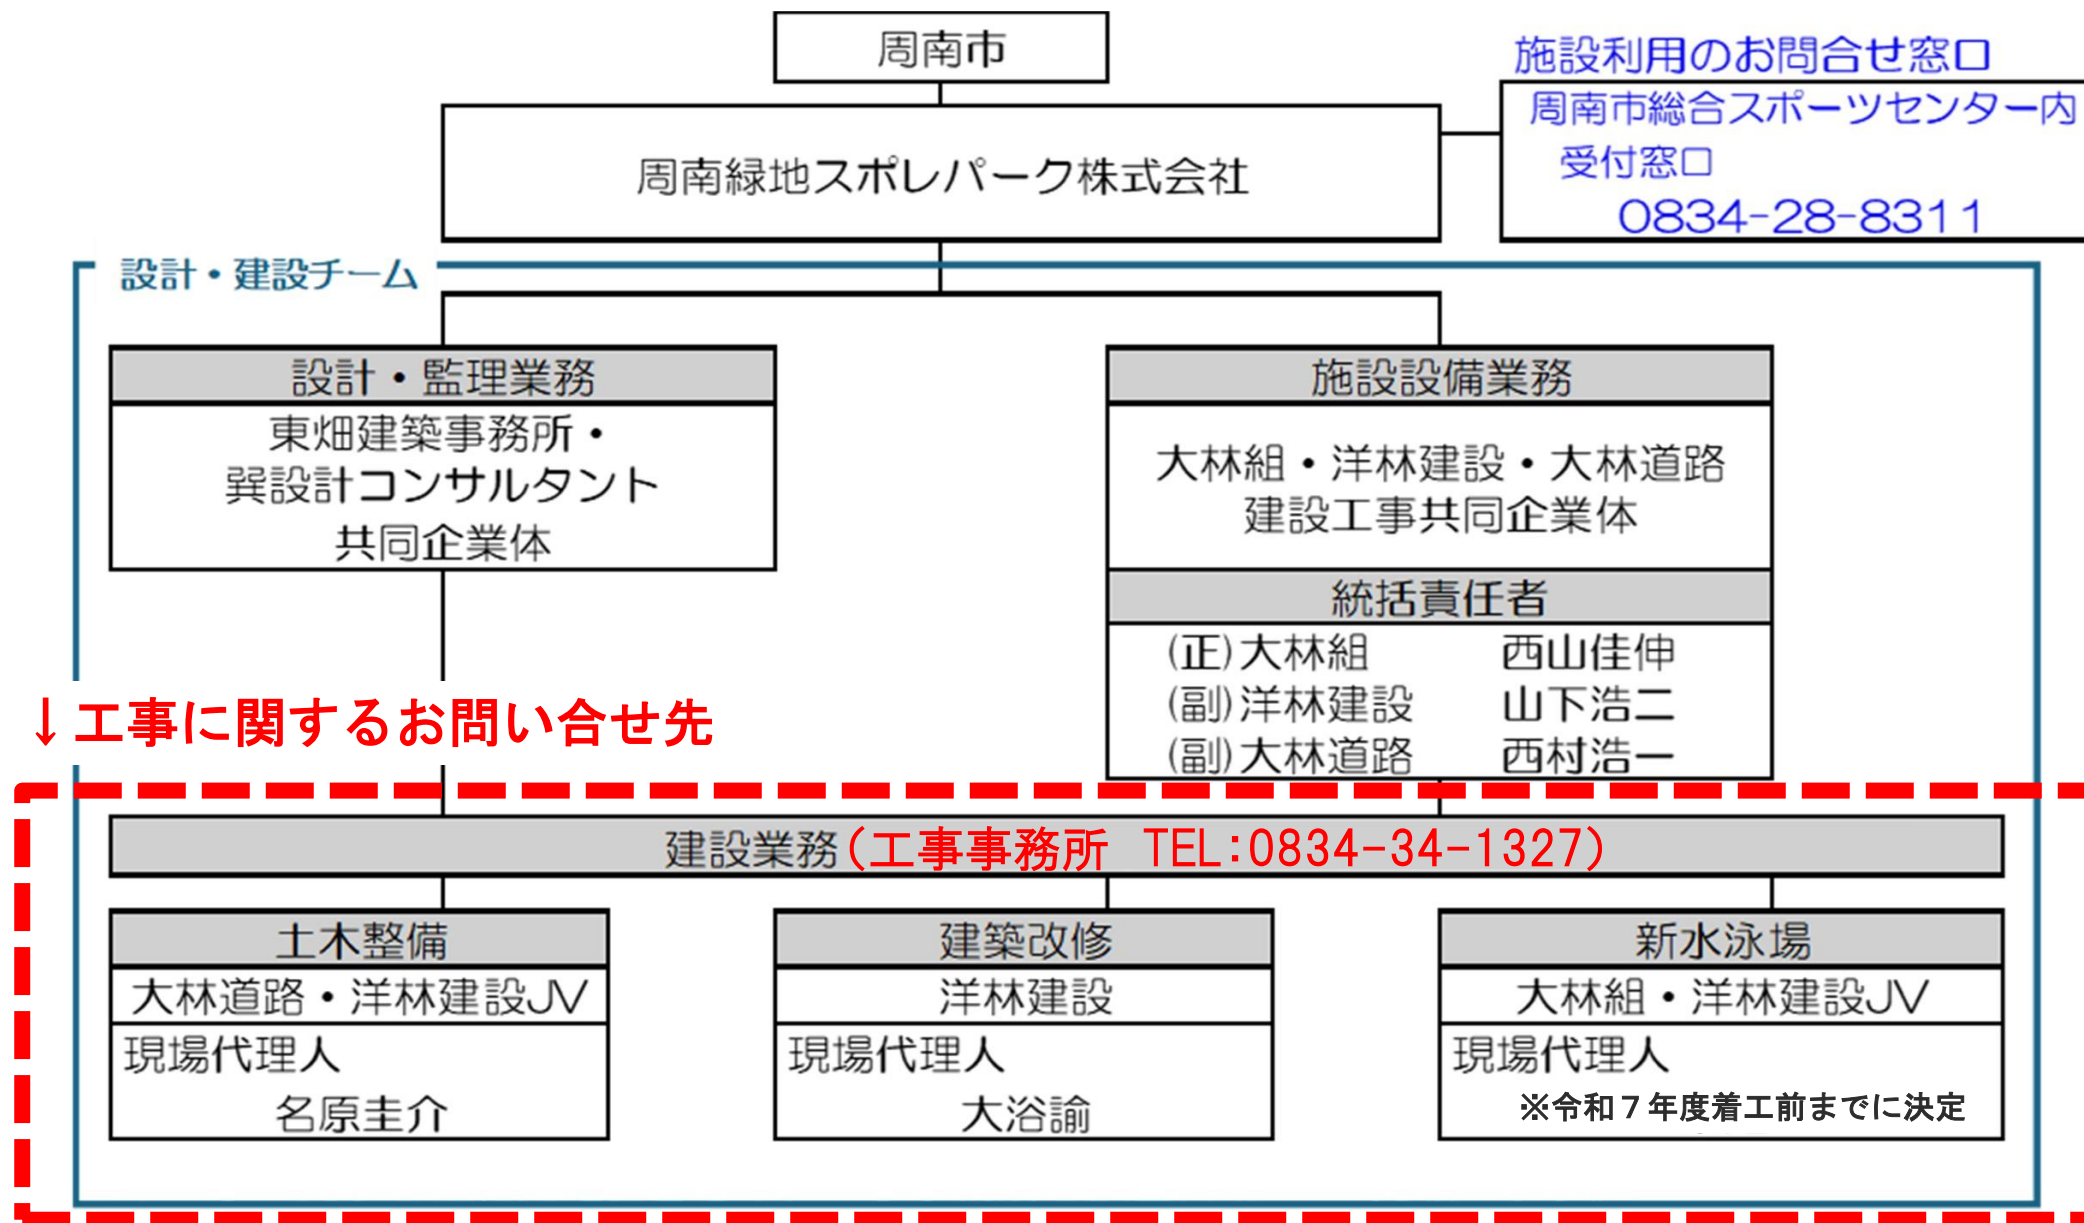

人通りが多い箇所に工事状況の 説明看板を設置し周知を図ります

工事事務所の設置位置や、現在、工事中の
箇所と利用不可エリアのお知らせ

中央緑地南側交差点部



東緑地園内交差点部



中央緑地北側交差点部




説明看板の設置位置

中央緑地北側交差点部

東緑地園内交差点部

中央緑地南側交差点部

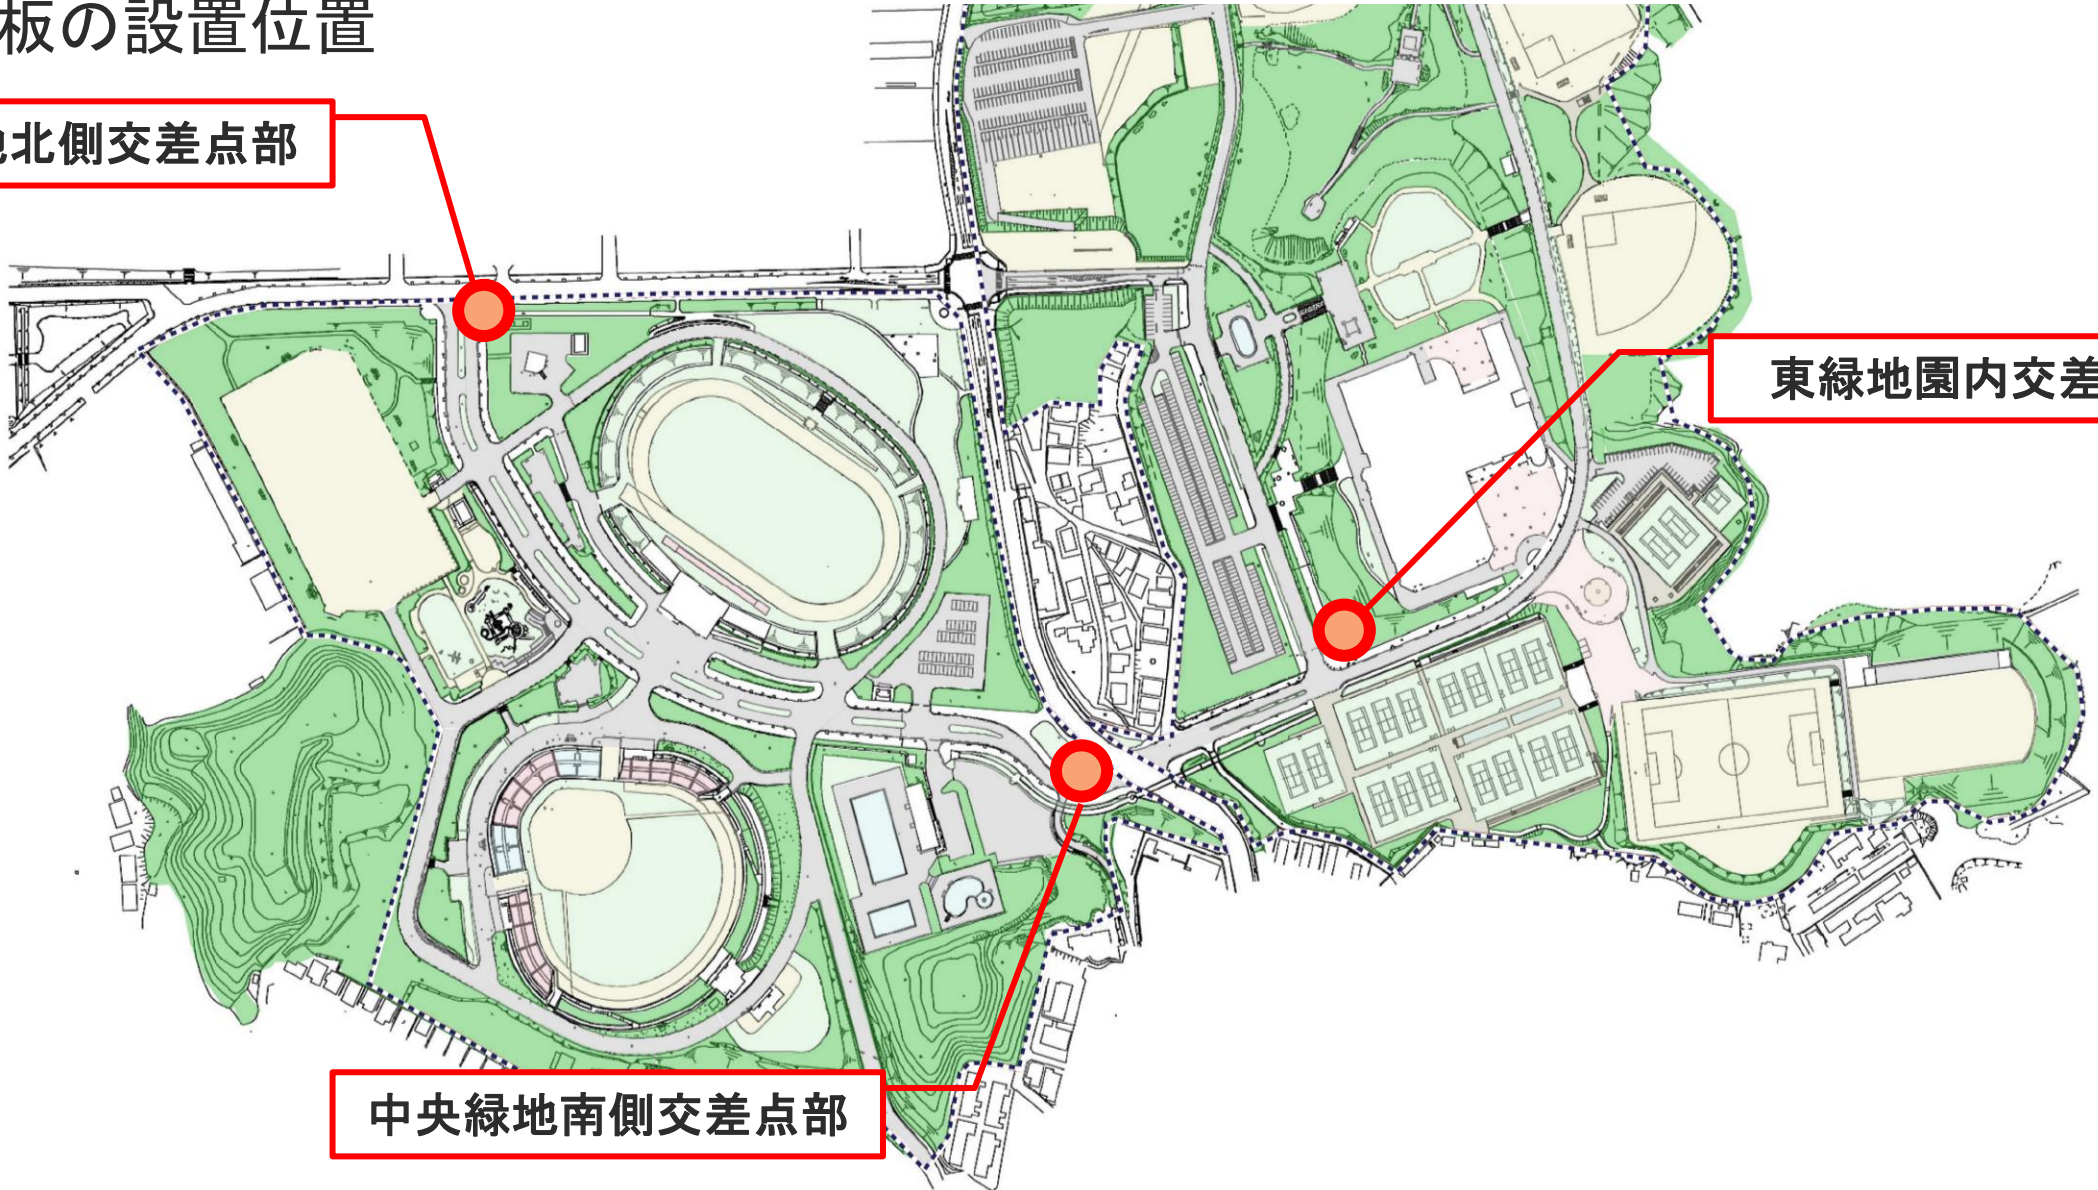

工事の期間中、ご近隣の皆様方には騒音、振動、工事車両の通行等、何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご理解のうえ、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

